システムバス 御見積書

御名前　港北ＳＲ 2FＳB2伸びの美　様

業者　様

商品名　伸びの美浴室

作成日　2018年7月17日
ﾌﾟﾗﾝ番号　2716H-1807-0181T
現場番号　A5698634

タカラスタンダード株式会社
◆港北営業所
神奈川県横浜市都筑区中川中央2丁目4-14
TEL 045-594-1612 / FAX 045-594-1616

◆港北ショールーム
TEL 045-594-1610 / FAX 045-594-1611

商品
御見積金額　\421,200　（税込 \454,896）

（　）内の価格は税込価格＜税率8％＞を表示しています。

《参考》別途 商品組付費　別途

※　商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
※　商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
　　又、給水･給湯･ガス･ダクト･電気等の接続工事は含まれておりません。

担当営業	担当ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ	ﾌﾟﾗﾝ作成者
濱田		大野

◆ 御見積仕様

《システムバス》	
ユニットサイズ	1116（AR勝手）
洗い場仕様	ガラス繊維強化樹脂＜ＦＲＰ＞
浴槽材質	ＦＲＰ
カラー	ホワイト
形状	セミスクエア浴槽
カウンター材質	樹脂
カラー	ホワイト
エプロン材質	樹脂
カラー	ホワイト
浴室パネル材質	高品位ホーロー
カラー	ロッシュグリーン
ガス種	未定
周波数	50Hz

◆ 備考

◆ 御確認事項

御名前 港北ＳＲ 2FＳB2伸びの美 様

現場番号	A5698634	プラン番号	2716H-1807-0181T	作成日	2018/7/17

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	伸びの美浴室Pタイプ 1116サイズ		1	395,000	395,000
2	架台	低床タイプ ボルト脚架台	1		
3	ドア	キープクリーンドア:折戸＜800mm幅＞(ホワイト)(18サイズ)	1		
4	洗い場	FRP洗い場(ホワイトグレー)	1		
5	浴槽	FRP	1		
6	エプロン	保温材なし	1		
7	浴槽形状	セミスクエア浴槽	1		
8	循環金具水受けトレーセット	なし	1		
9	浴槽追い焚き穴	あり	1		
10	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
11	浴槽パン	あり	1		
12	洗い場用水栓	サーモ水栓(樹脂ホース) KF9032S	1		
13	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド	1		
14	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
15	カウンター	スリムカウンター	1	-1,500	-1,500
16	シャワーフック/スライドバー	シャワーフック	1		
17	浴室パネル	レギュラークラス(Fタイプ)	1		
18	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
19	天井	フラット天井	1		
20	換気機器	天井換気扇	1		
21	換気機器開口	工場開口	1		
22	照明	照明W(LED)	1		
23	ミラー	スリムミラー	1	+5,500	+5,500
24	風呂フタ	風呂フタなし	1		
25	タオル掛け	タオル掛けなし	1		
26	ハンドバー	樹脂製 I型400タイプ(ホワイト)	1	+8,000	+8,000
27	収納棚	スクエアタイプ(3段) ＜ホワイト＞	1	+1,700	+1,700
28	循環金具セット	PLLX	1	+12,500	+12,500
29	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
30	トラップカバー	なし	1		
	システムバス合計		30		\421,200

御名前 港北ＳＲ 2FＳB2伸びの美 様

現場番号	A5698634	プラン番号	2716H-1807-0181T	作成日	2018/7/17

商品総合計	30	\421,200

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費

システムバス商品組付費	別途

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水･給湯･ガス･ダクト･電気等の接続工事は含まれておりません。

（ ）内の価格は税込価格＜税率8％＞を表示しています。

パース

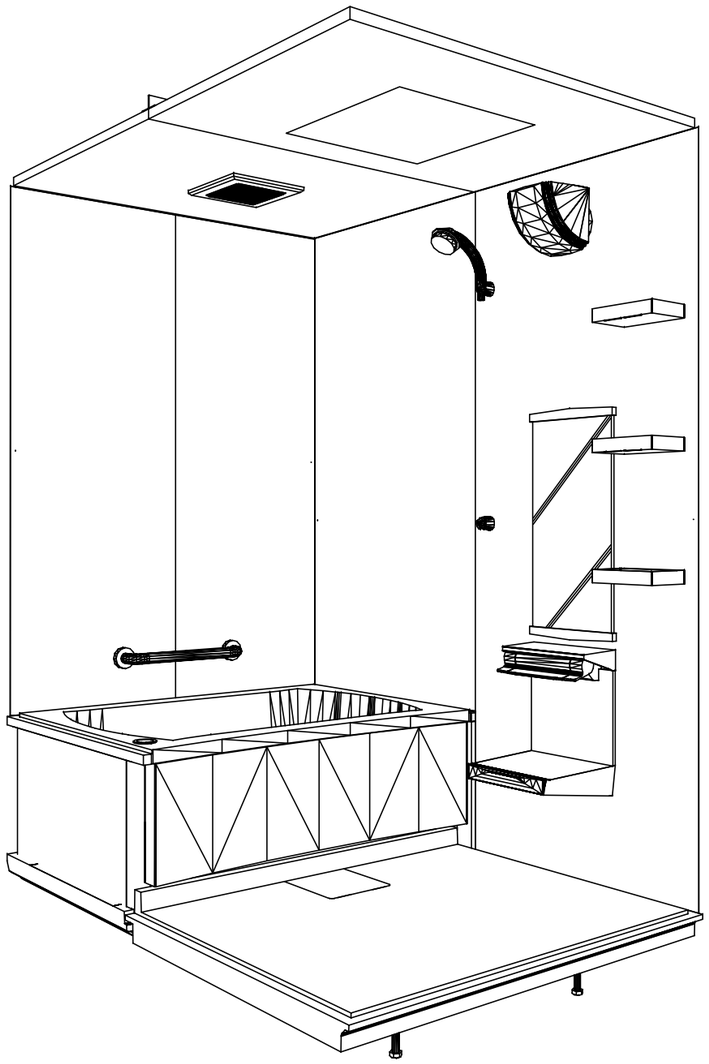

鳥瞰図

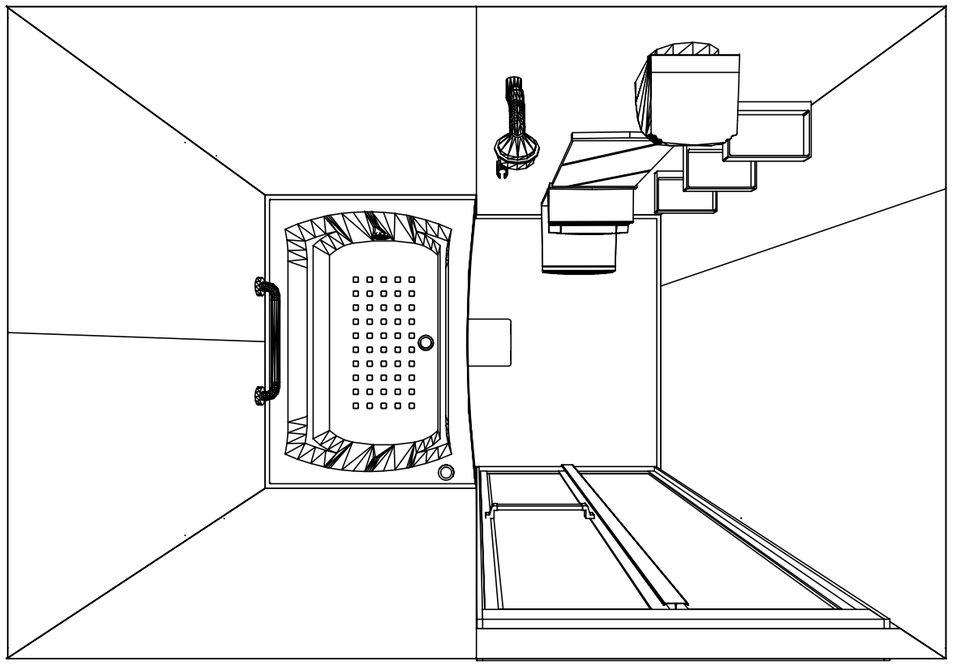

1116
ガラス繊維強化樹脂<FRP>浴槽
フラット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 港北ＳＲ 2Ｆ ＳＢ2伸びの美様邸	伸びの美浴室	姿図
	現場番号： A5698634	プラン番号： 2716H-1807-0181T	作成日： 2018年7月17日
	港北営業所	担当営業　： 濱田	担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍



■留意事項
※印寸法は給水給湯管の
突出寸法18mmを含みます。

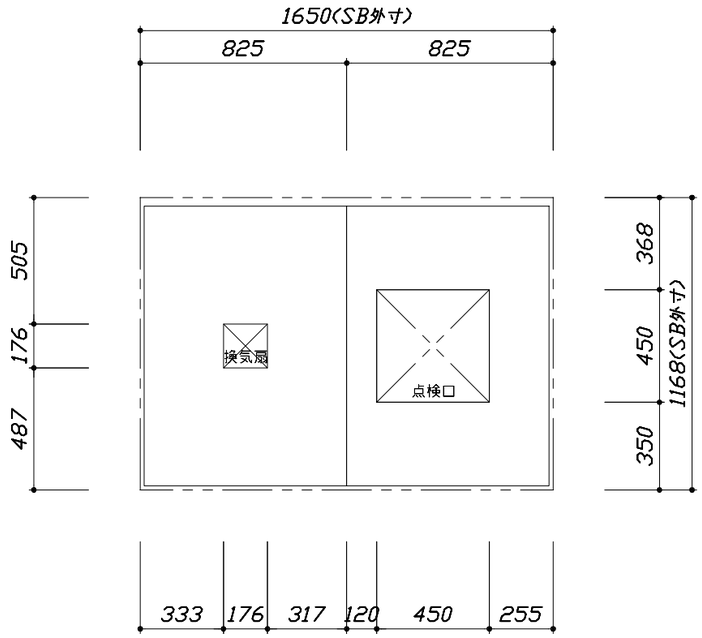

＜天井伏図＞

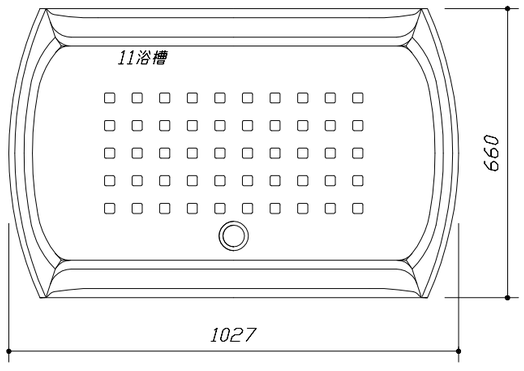

＜浴槽詳細図＞

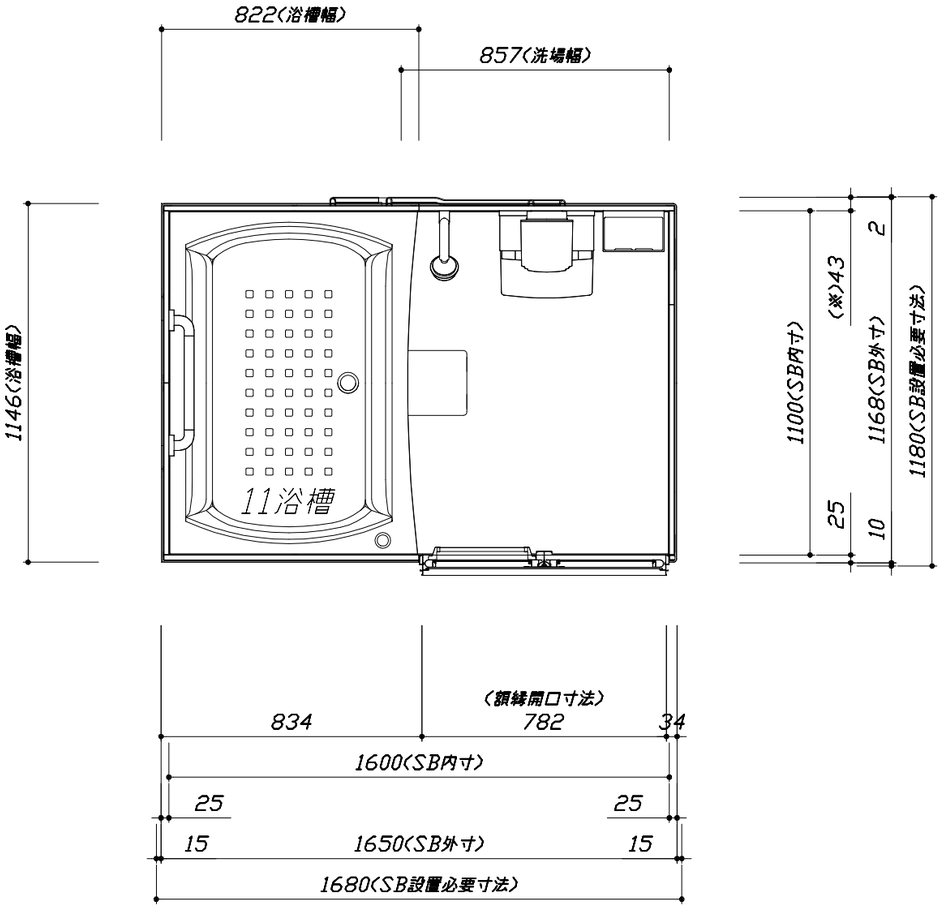

＜平面図＞

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 港北ＳＲ 2FＳB2伸びの美様邸	伸びの美浴室	施工図1	縮　尺： 1:25,20
	現場番号： A5698634	プラン番号： 2716H-1807-0181T	作成日： 2018年7月17日	
	港北営業所	担当営業　： 濱田	担当アドバイザー：	

縮尺：A3サイズ等倍

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細に
ついては注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。
・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
・天井の寸法はご確認お願いします。
・外寸は突出部を含みます。



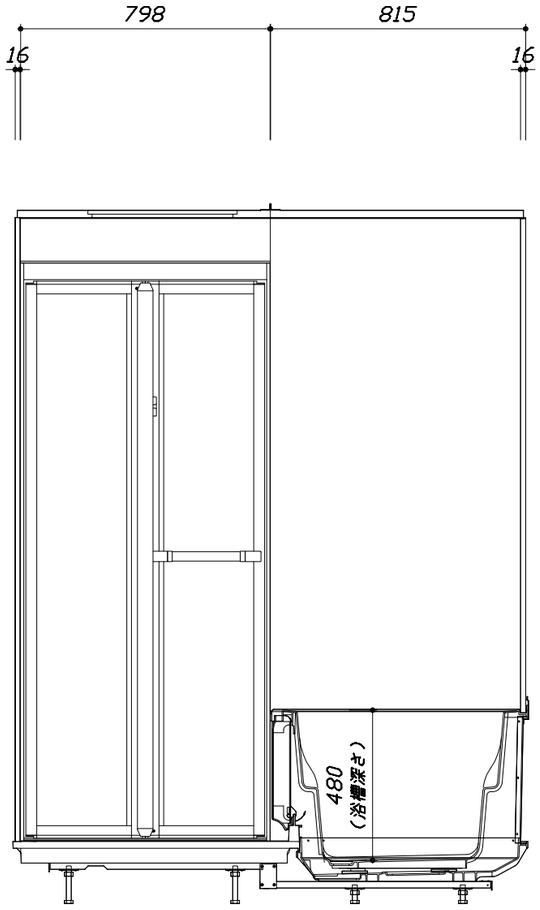

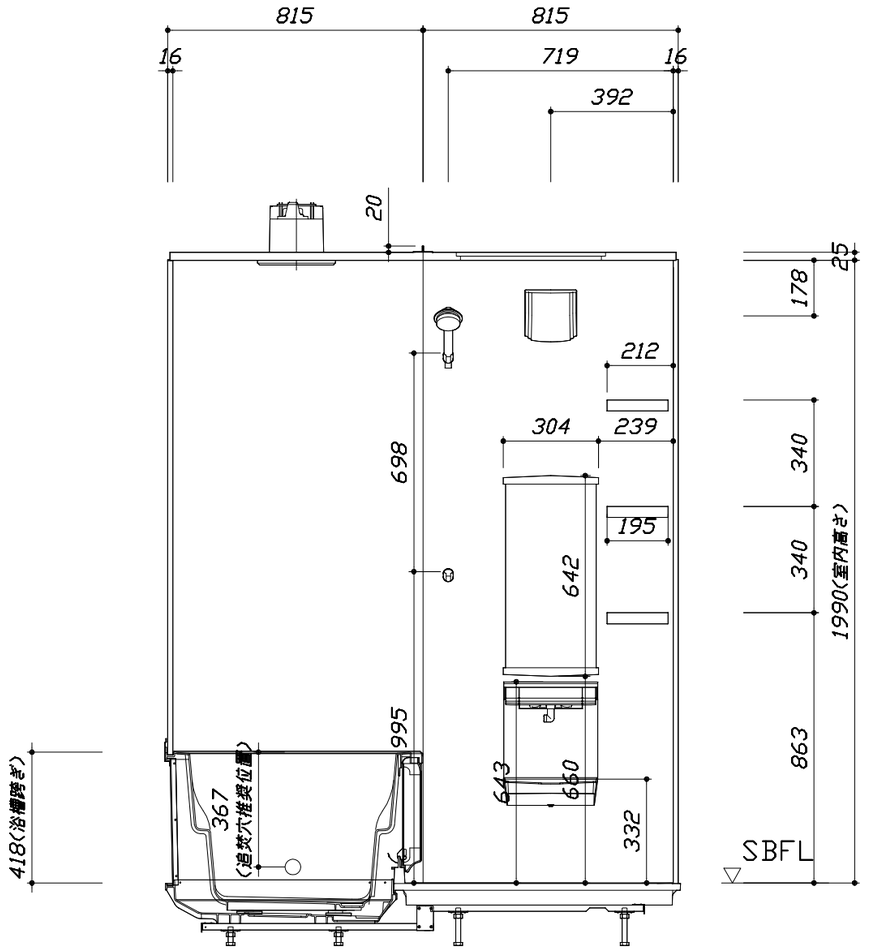

■ボルト脚架台高さ寸法
沓ずり高さに対して
－９～＋１１mm調整可能

＜カウンター対面図＞

＜カウンター面図＞

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 港北ＳＲ 2FＳB2伸びの美様邸	伸びの美浴室	施工図2	縮　尺： 1:20
	現場番号： A5698634	プラン番号： 2716H-1807-0181T	作成日： 2018年7月17日	
	港北営業所	担当営業　： 濱田	担当アドバイザー：	

縮尺：A3サイズ等倍

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細に
ついては注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。
・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
・天井の寸法はご確認お願いします。
・外寸は突出部を含みます。



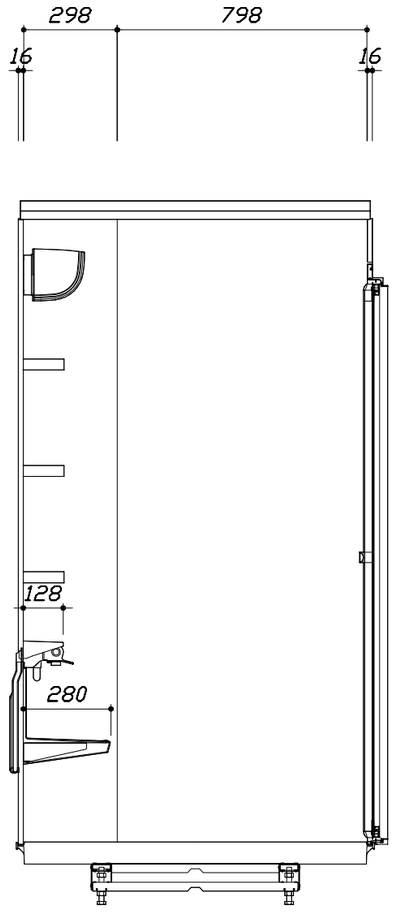

＜洗場側面図＞

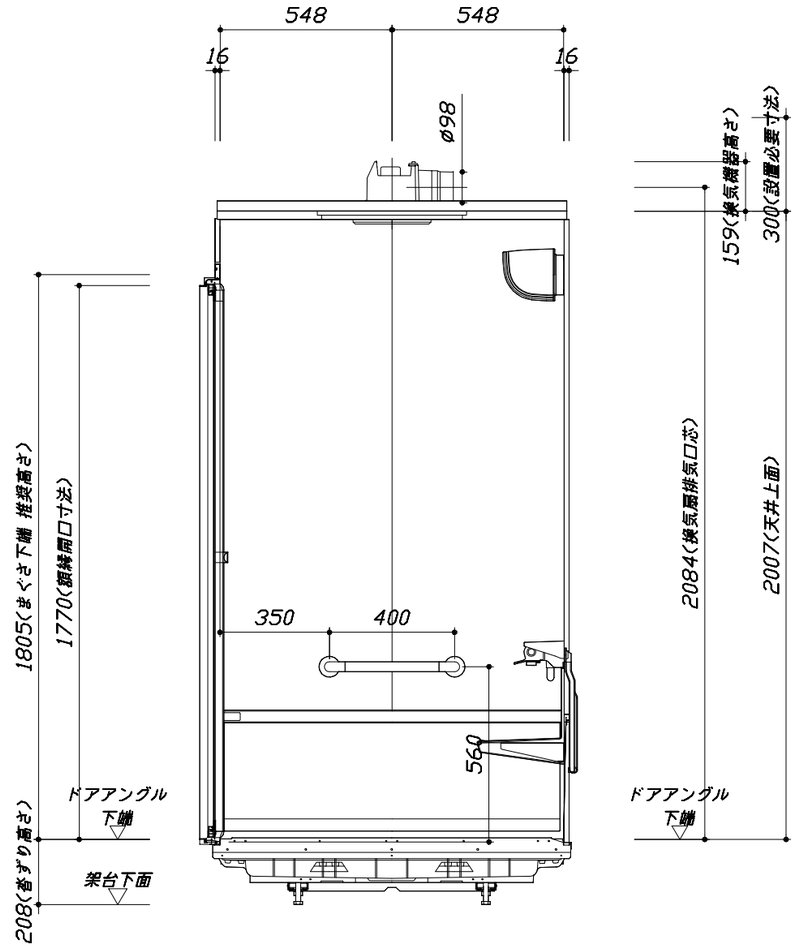

■ボルト脚架台高さ寸法
巾ずり高さに対して
－９～＋１１mm調整可能

＜浴槽側面図＞

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 港北ＳＲ 2Ｆ ＳＢ2伸びの美様邸	伸びの美浴室	施工図３ / 縮　尺： 1:20
	現場番号： A5698634	プラン番号： 2716H-1807-0181T	作成日： 2018年7月17日
	港北営業所	担当営業　： 濱田	担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

本体仕様表

浴室サイズ	1116サイズ(室内容量3.5立方メートル)
ドア勝手	AR勝手
架台	ボルト脚架台(低床タイプ)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	ガラス強化繊維樹脂（FRP）
浴槽材質	ガラス強化繊維樹脂（FRP）裏面保温材（発泡ウレタン）
浴槽形状	セミスクエア浴槽（11浴槽・245リットル）追い焚き穴:あり
浴槽パン	ガラス強化繊維樹脂（FRP）
浴槽エプロン	ＡＢＳ樹脂
カウンター	スリムカウンター：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さFタイプ：鋼板硬質ホーロー　裏面保温材　タオル掛け穴:なし
天井	ﾌﾗｯﾄ天井：化粧ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：なし
ドア	キープクリーンドア：18高さ折戸(アルミ框/樹脂ガラス)
窓１	―
窓２	―
窓枠１	―
窓枠２	―
排水トラップ	ＡＳＡ樹脂・封水50㎜
雑排水配管	硬質塩ビパイプ　VP50
製品重量	203kg

アクセサリー仕様表

ミラー	スリムミラー
収納棚	スクエアタイプ：ABS樹脂製（3段）
タオル掛け	―
洗場側水栓	ｻｰﾓｼｬﾜｰ付(樹脂ﾎｰｽ仕様・KF9032SN)
浴槽側水栓	―
兼用水栓	―
スライドバー	―
照明	照明W　(LED　8W電球色)
換気機器	天井換気扇(100V･最大消費電力9.3W)(ﾀﾞｸﾄ径φ98)
フロフタ	―
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットPLLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	―
ハンドバー②	―
ハンドバー③	―
ハンドバー④	樹脂製　I型400タイプ　ホワイト
ハンドバー⑤	―
ハンドバー⑥	―
ハンドバー⑦	―

本体カラー

浴槽	W：ホワイト
カウンター	W：ホワイト
ﾊﾟﾈﾙ(ｶｳﾝﾀｰ面)	HR：ロッシュグリーン
ﾊﾟﾈﾙ(周辺･3面)	W：ホワイト
水栓上部ｶｳﾝﾀｰ	W：ホワイト
浴槽エプロン	W：ホワイト
洗場	W：ホワイトグレー
ドア	W：ホワイト
収納棚	スクエアタイプ(W:ホワイト)
タオル掛け	―
ﾗﾝﾄﾞﾘｰｾｯﾄ	―

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称：　港北ＳＲ 2Ｆ ＳＢ2伸びの美様邸	伸びの美浴室	仕様表	
現場番号：　A5698634	プラン番号：　2716H-1807-0181T	作成日：　2018年7月17日	
港北営業所	担当営業　：　濱田	担当アドバイザー：	

■ 排水配管工事注意事項

●雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
●2重トラップにしないでください。
●配管途中で配管径を狭めないでください。
●排水勾配は1/100～1/50設けてください。
●排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
●立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。



■ 給水給湯管工事注意事項

●給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
●給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
●給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

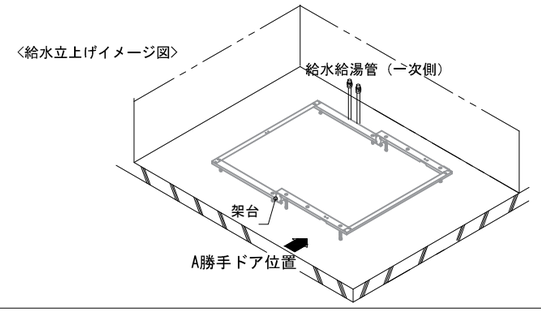

■設備記号

記号	記号の意味
⊠	給水位置
●	給湯位置
▨	排水管立上げ推奨範囲（VP50）





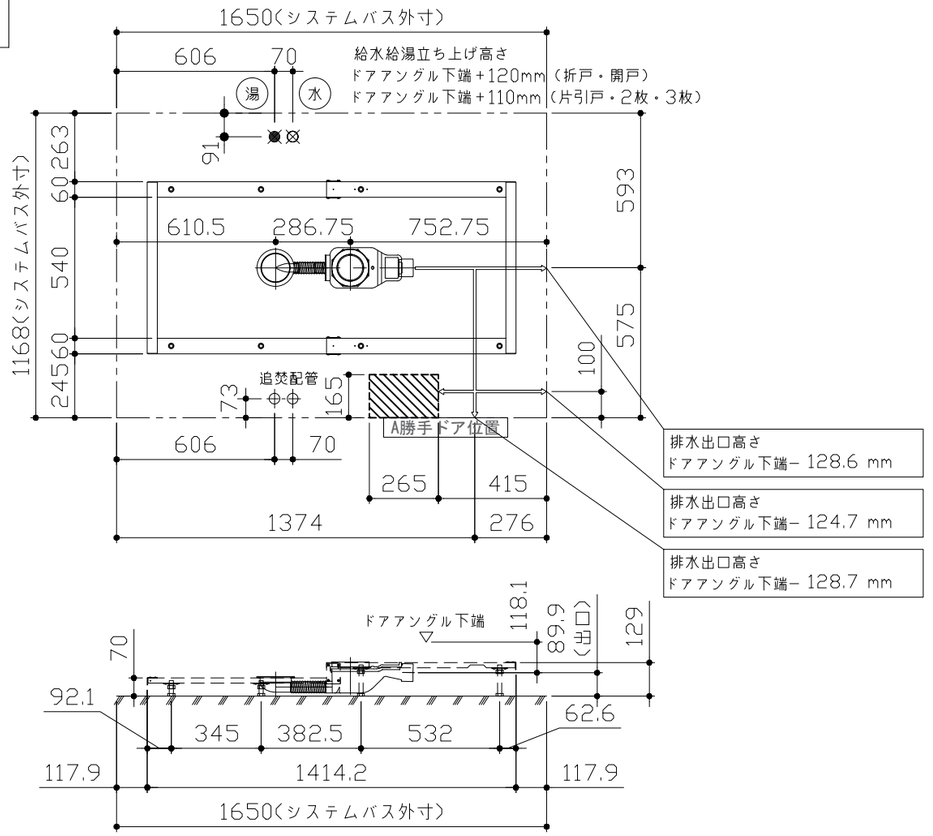

〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

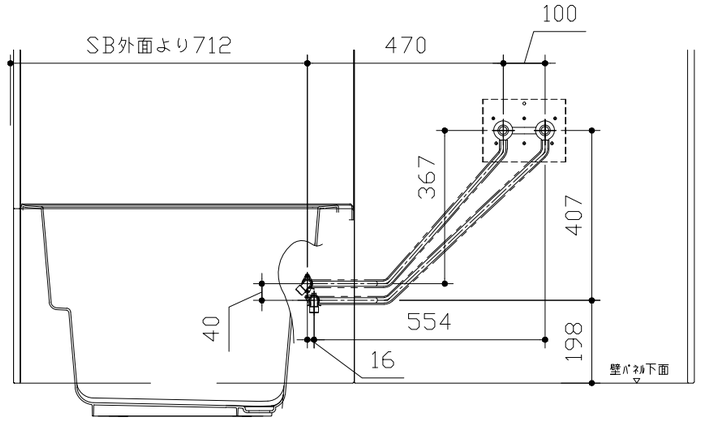



〈給水給湯管取合詳細図〉

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 港北ＳＲ 2Ｆ ＳＢ2伸びの美様邸	伸びの美浴室	排水配管図
	現場番号： A5698634	プラン番号： 2716H-1807-0181T	作成日： 2018年7月17日
	港北営業所	担当営業 ： 濱田	担当アドバイザー：

■必ずご確認ください
（１）図面の見方
・ＳＢ外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
・マス表示：□＝20mm角

（２）留意事項
・浴槽パンの配管導入口下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
・ドア部はＳＢ外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。







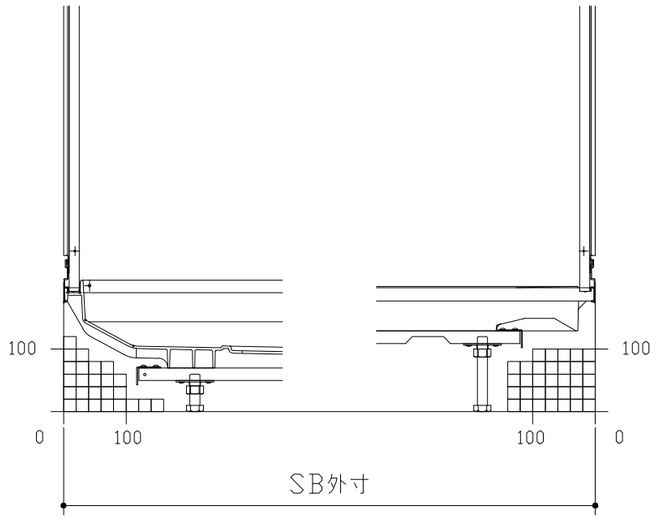

A矢視　　B矢視

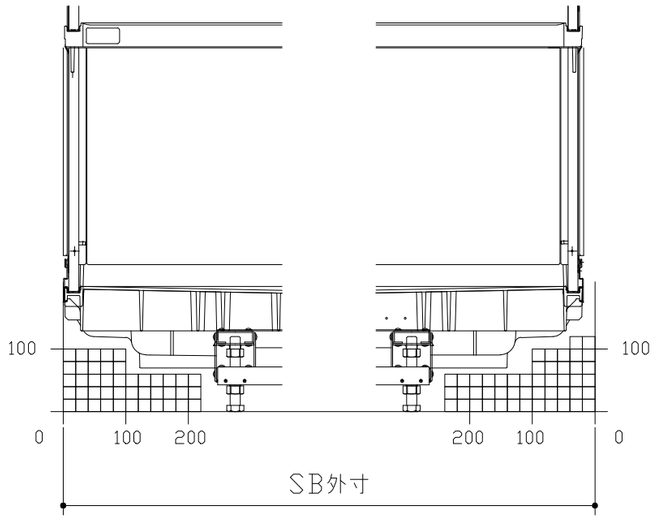

C矢視　　D矢視

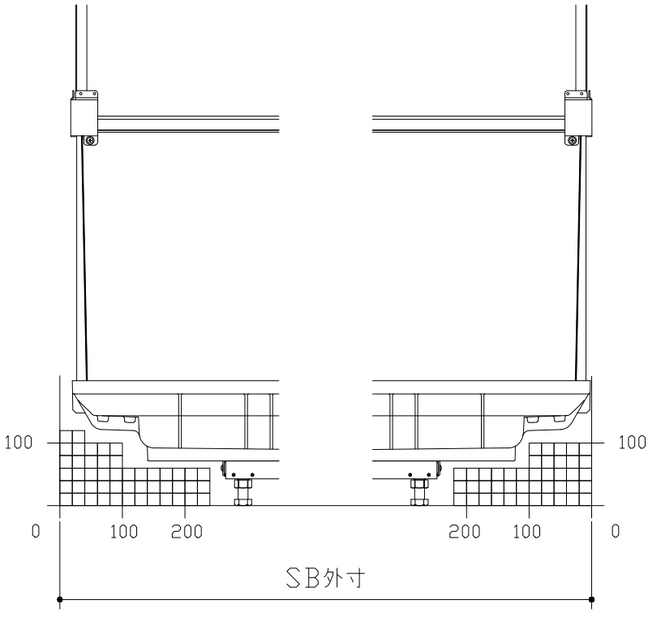

E矢視　　F矢視

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：　港北ＳＲ　2Ｆ ＳＢ2伸びの美様邸	伸びの美浴室	床下空間図
	現場番号：　A5698634	プラン番号：　2716H-1807-0181T	作成日：　2018年7月17日
	港北営業所	担当営業　：　濱田	担当アドバイザー：

キープクリーンドア：折戸ホワイト（AWTｵﾙﾄﾞ8）

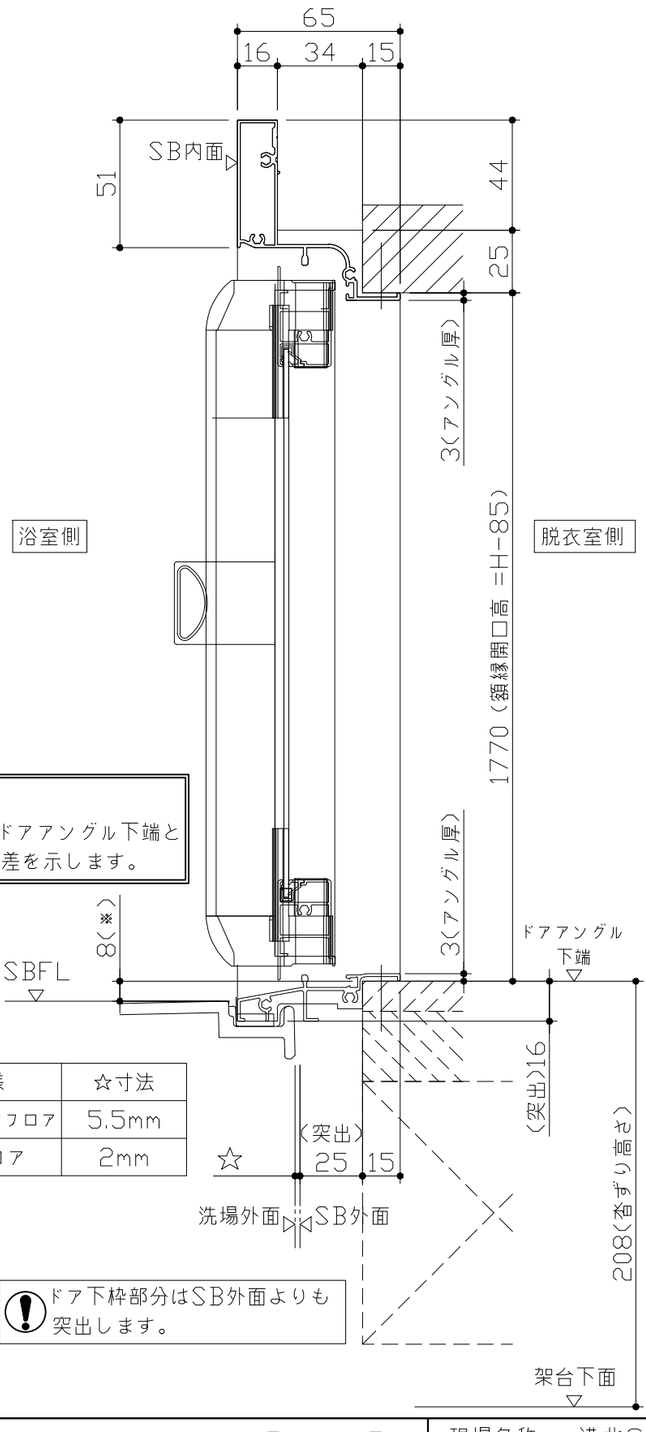

■留意事項
※印寸法はドアアングル下端とSBFLの段差を示します。

ドア仕様	☆寸法
キープクリーンフロア	5.5mm
FRPフロア	2mm

ドア下枠部分はSB外面よりも突出します。

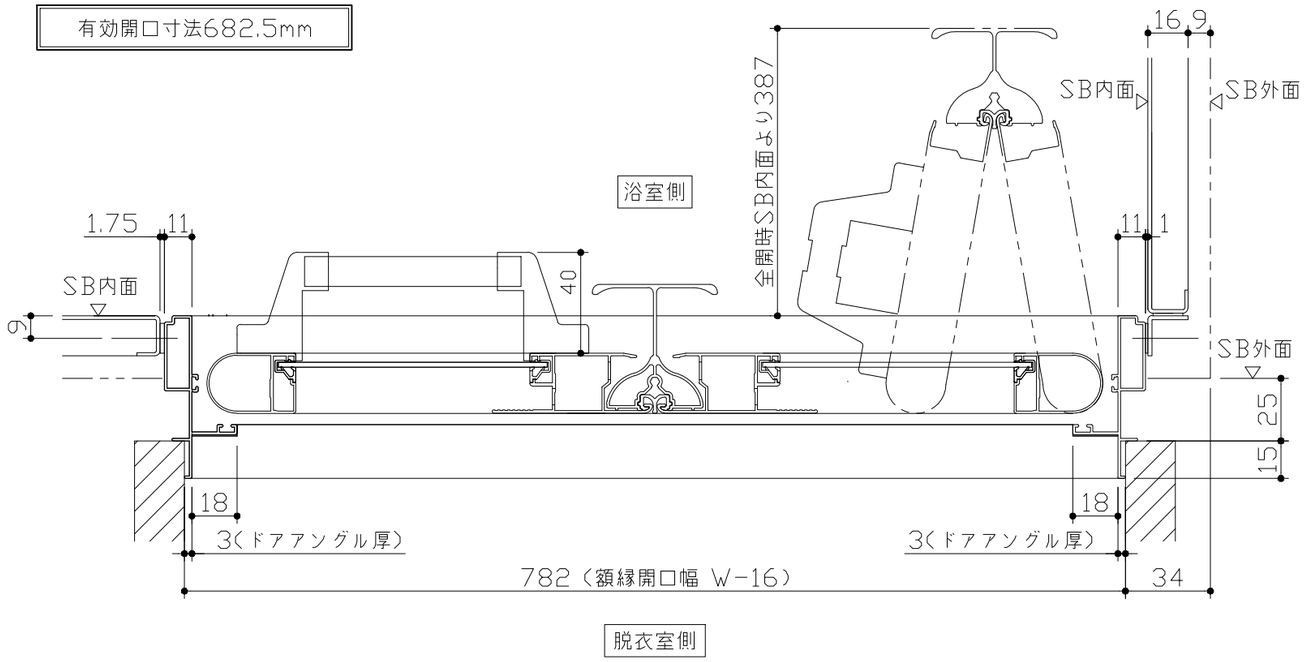

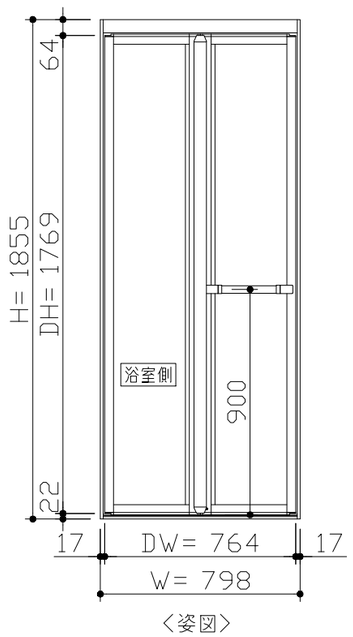

〈姿図〉

■ドア横の管柱、間柱について
- ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
- 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉



Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 港北ＳＲ 2Ｆ ＳＢ2伸びの美様邸	伸びの美浴室	ドア取合詳細図
	現場番号： A5698634	プラン番号： 2716H−1807−0181T	作成日： 2018年7月17日
	港北営業所	担当営業 ： 濱田	担当アドバイザー：

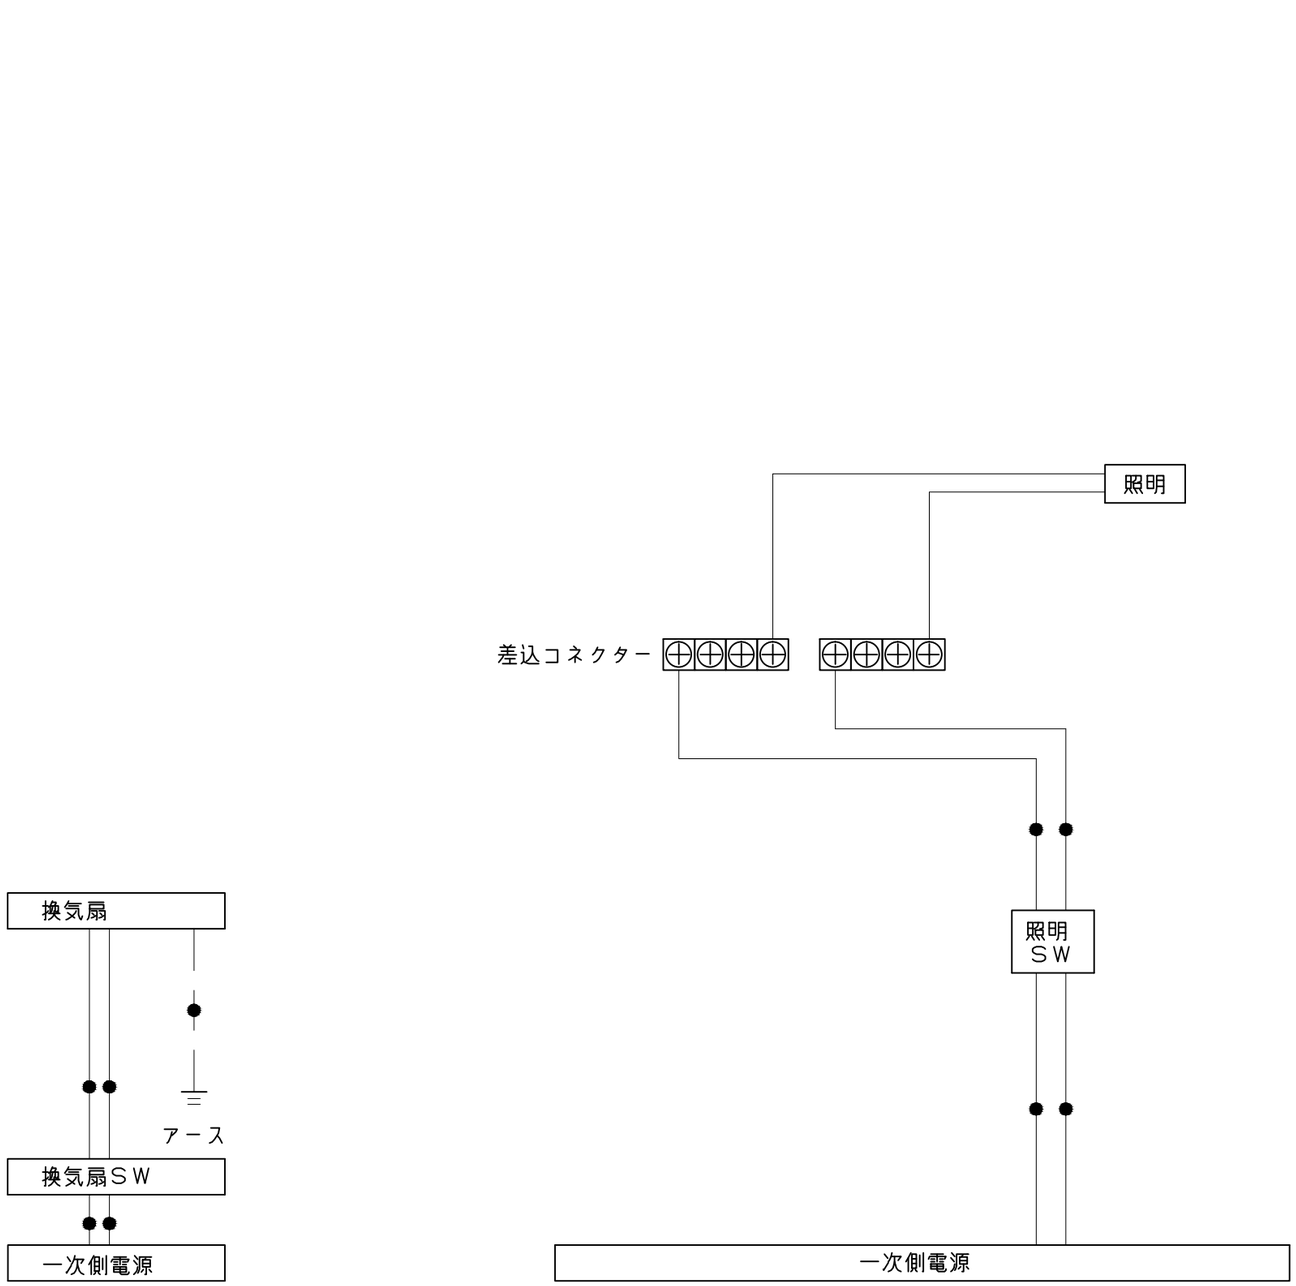

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 港北ＳＲ 2Ｆ ＳＢ2伸びの美様邸	伸びの美浴室	電気配線図
	現場番号： A5698634	プラン番号： 2716H-1807-0181T	作成日： 2018年7月17日
	港北営業所	担当営業 ： 濱田	担当アドバイザー：

浴槽

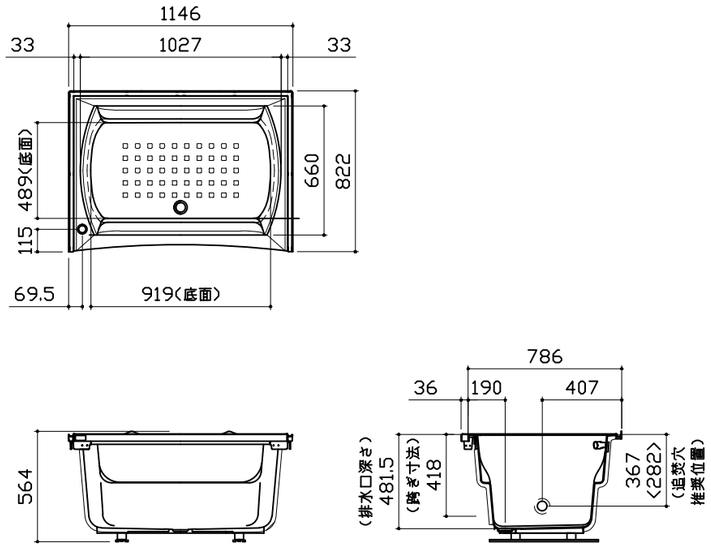

※漏水受け仕様の場合は< >内寸法参照のこと

洗い場用水栓

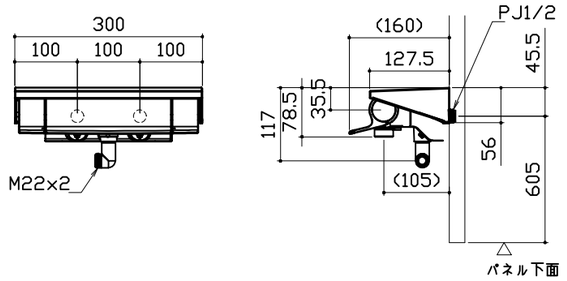

照明

照明W
使用電球：LED電球8W（1灯あたり）　口金E26

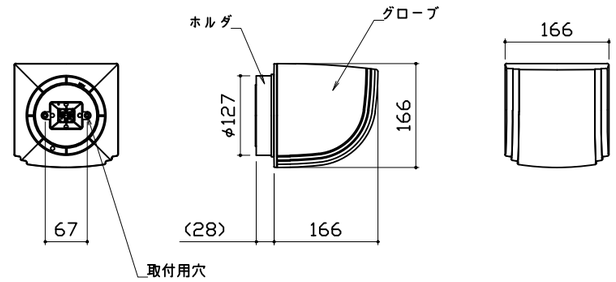

換気機器

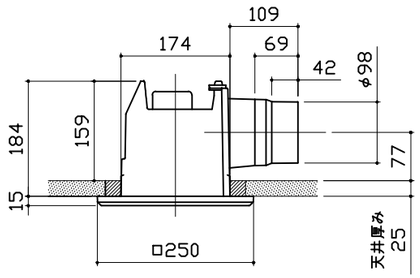

カウンター

本体：ABS

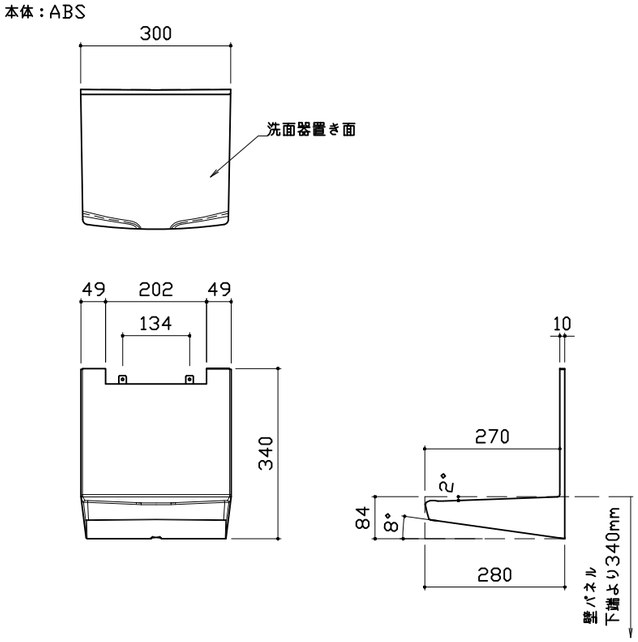

ミラー

枠：ABS
ミラー：表面防曇コートなし

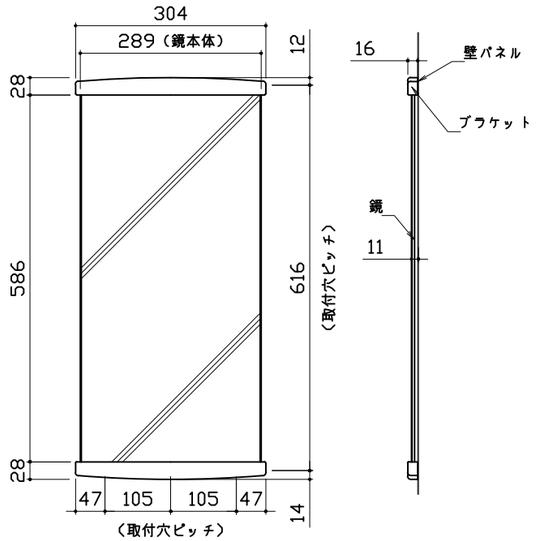

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称：　港北ＳＲ 2Ｆ ＳＢ2伸びの美様邸	伸びの美浴室	部材詳細図	1/2
現場番号：　A5698634	プラン番号：　2716H-1807-0181T	作成日：　2018年7月17日	
港北営業所	担当営業　：　濱田	担当アドバイザー：	
